



令和7年8月豪雨災害 復旧だより 第5号

令和8年8月31日発行
始良・伊佐地域振興局 建設部

あの日・あの時 - 令和7年8月7日～8日の豪雨による被害 -

■令和7年8月7日の夕方～8日明け方にかけて、始良市・霧島市では記録的な大雨に見舞われ、道路の法面崩壊、河川の浸水被害や河岸欠壊、がけ崩れ等の土砂災害など多数の公共土木施設災害が発生しました。

■県が管理する公共土木施設の被災状況は、344箇所、被害総額は約169億円(1月30日災害査定終了)にのぼり、平成5年8月上旬以来の大規模災害となりました。



県管理公共土木施設の被害状況および対応状況

(単位: 億円)

工 種	国災害復旧事業		対応状況(箇所数)				備 考
	箇所数	金額	災害調査	応急工事	災害査定	復旧工事	
道 路	37	30.3	37	9	37	15	応急工事の他、県有施設復旧事業により道路啓開を多数実施
河 川	302	137.0	302	66	302	269	網掛川33箇所は災害関連事業で実施
砂 防	1	0.2	1	0	1	1	
急傾斜	2	1.4	2	1	2	2	
その他	2	0.3	2	1	2	2	福山港泊地埋塞等
計	344	169.3	344	77	344	289	契約率84%

※金額および災害査定は、1月30日までの災害査定結果の累計。復旧工事は、契約済み箇所数
河川氾濫や土砂災害に係る災害関連事業を除く。

これまでの取組と災害復旧の流れ

災害調査
完了

■大規模災害支援協定に基づく協力団体による災害調査



■国による災害緊急調査



道路啓開・応急工事
完了

■道路啓開や大規模災害支援協定に基づく建設業関係団体による応急工事を実施。



災害査定

国庫補助事業による復旧工事の費用を決定するため、国が被害の程度や復旧工法・費用が適切か現地調査を実施(令和7年10月27日～令和8年1月30日)

調査設計

査定結果を踏まえた工法見直しや、構造物がある箇所について詳細に検討。

用地取得

道路や崖崩れ等の法面工事、河川拡幅・砂防堰堤工事等において用地を取得。

復旧工事

緊急性の高い箇所、調査設計や用地取得を伴わない箇所から順次、工事着手。

お問合せ先

[道路災害]
[河川・土砂災害]

始良・伊佐地域振興局建設部土木建築課
" 河川港湾課

TEL 0995-63-8365 FAX 0995-63-8345 (E-Mail) airaisa-doboku@pref.kagoshima.lg.jp
TEL 0995-63-8367 FAX 0995-63-8345 (E-Mail) airaisa-kasen@pref.kagoshima.lg.jp

※始良・伊佐地域振興局のホームページでも確認できます。 <https://www.pref.kagoshima.jp/an14/r07saigaijoukyou/0708gatugouusaigai.html>



HP URL

主な災害箇所（始良市・霧島市）

令和8年8月31日発行
始良・伊佐地域振興局 建設部

始良市



通行規制状況

災害時通行止め 26箇所

規制解除 18箇所

交通開放 3箇所

通行止め 5箇所

霧島市

霧島市




区分		始良市	霧島市
道路災害	通行規制 (箇所数)	県道 十三谷重富線 (1箇所)	国道223号 (1箇所) 県道 犬飼霧島神宮停車場線 (1箇所) 県道 隼人溝辺線 (1箇所) 県道 豊後迫隼人線 (2箇所) 県道 大川原小村線 (2箇所)
	浸水被害	網掛川(小山田), 宇曾ノ木川, 山田川	角之下川
河川災害	護岸損壊	網掛川(港町, 木田)	手籠川
	砂防	狩川右支溪	田方川
土砂災害	急傾斜	岩戸地区	国分敷根地区

主な災害箇所の対応状況（始良市）

令和8年8月31日発行
始良・伊佐地域振興局 建設部

網掛川水系網掛川（②始良市加治木町港町地内・本町地区、③始良市加治木町木田地内、④始良市加治木町小山田地内）、⑤網掛川水系宇曾ノ木川（始良市加治木町木田地内）

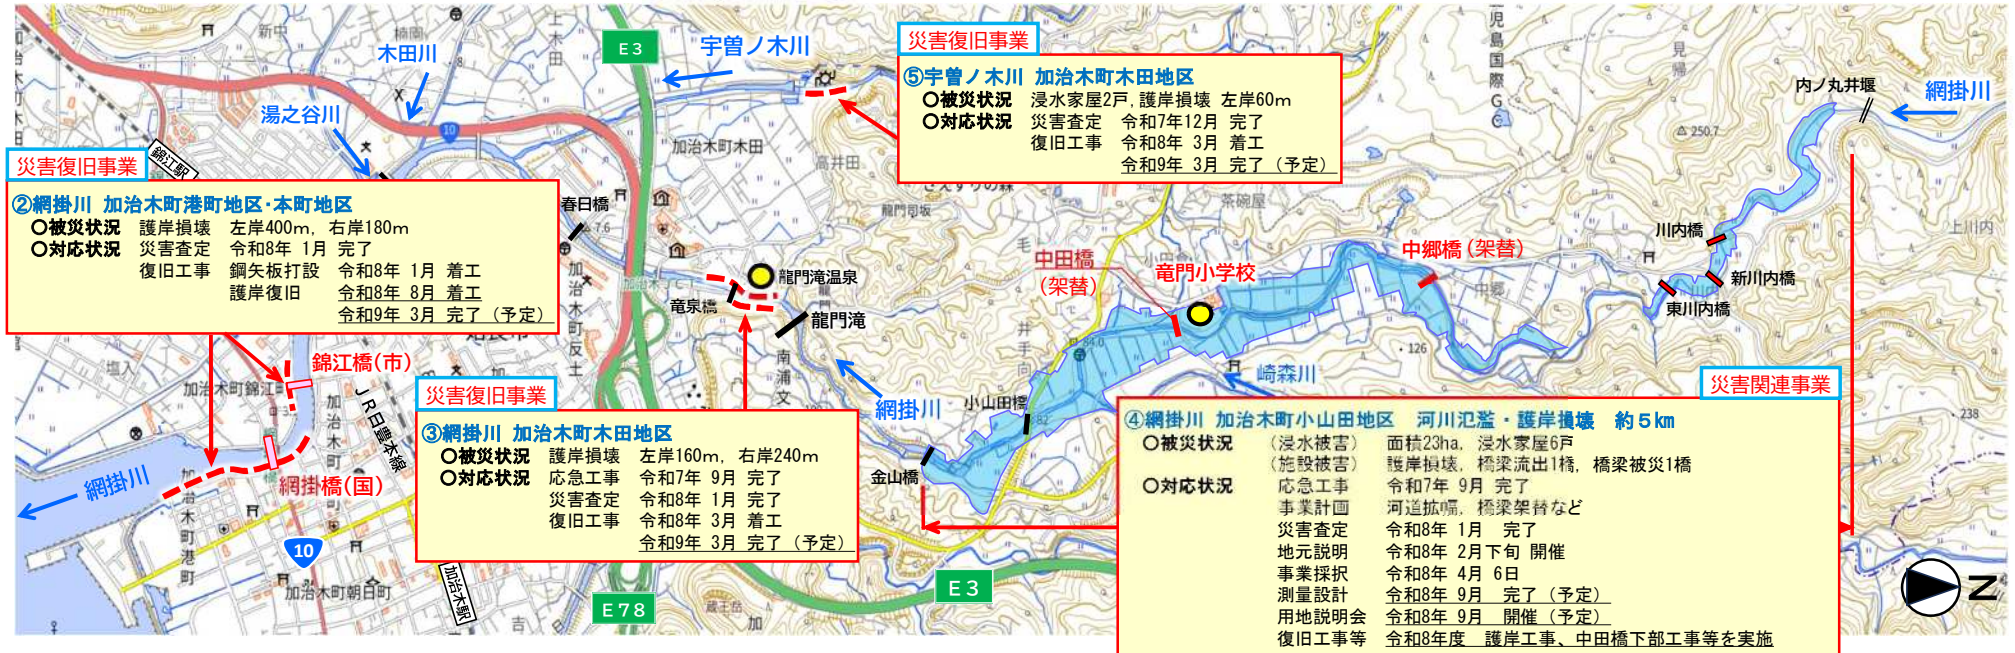

①県道 十三谷重富線（始良市北山地内）

- 被災状況**
道路流出 1箇所 L=21m, H=35m
- 対応状況**
通行規制 令和7年12月20日～片側通行
迂回路を山手側に設置
- 災害査定 令和7年12月 完了
調査設計 令和8年 1月 完了
用地取得 令和8年 6月 取得
復旧工事 令和8年 7月 着工
令和9年 3月 完了（予定）



災害復旧事業

⑦崖崩れ 岩戸地区（始良市蒲生町白男地内）

- 被災状況**
建物被害 全壊1戸
人的被害 死者1名, 負傷者2名
- 対応状況**
事業採択 令和7年 9月5日 採択
擁壁工, 法面工 令和8年 3月 完了
調査設計 令和8年 6月 取得
用地取得 令和7年12月 応急完了
対策工事 令和8年 7月 着工
令和9年 1月 完了（予定）



災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業

⑥別府川水系山田川（始良市下名地内）

- 被災状況**
浸水被害 A=5.5ha, 浸水家屋58戸
施設被害 護岸損壊 2箇所 右岸 L=57m
- 対応状況**
災害査定 令和7年12月 完了
調査設計 令和8年 1月 完了
復旧工事 令和8年 3月 着工
令和8年10月 完了（予定）



災害復旧事業

⑧土石流 狩川右支溪（始良市平松地内）

- 被災状況**
建物被害 一部損壊5戸 人的被害なし
- 対応状況**
事業採択 令和7年 9月5日 採択
砂防堰堤1基 新設
- 調査設計 令和8年 3月 完了
地元説明 令和8年 3月下旬 開催
用地取得 令和8年 9月 取得（予定）
対策工事 令和8年10月 着工（予定）



災害関連緊急砂防事業

主な災害箇所の対応状況（霧島市）

令和8年8月31日発行
始良・伊佐地域振興局 建設部

①国道223号（霧島市牧園町宿窪田内）

災害復旧事業

○被災状況

法面崩壊 3箇所 L=27~40m
H=15~90m

○対応状況

通行規制 令和7年10月17日～片側通行
災害査定 令和7年12月 完了
調査設計 令和8年 3月 完了
用地取得 令和8年 7月 取得
復旧工事 令和8年 9月 着工（予定）
令和9年 3月 完了（予定）

被害状況（斜面崩壊）



R7. 10. 17 交通開放（片側）



⑤天降川水系 手籠川（霧島市国分重久内）

災害復旧事業

○被災状況

護岸損壊 2箇所 右岸110m, 左岸90m
農地流出 約0.1ha

○対応状況

応急工事 令和7年 8月 完了
災害査定 令和7年12月 完了
調査設計 令和8年 1月 完了
復旧工事 令和8年 3月 着工
令和9年 3月 完了（予定）

被災状況



R7. 8. 29 応急工事完了



②県道 犬飼霧島神宮停車場線（霧島市牧園町下中津川内）

災害復旧事業

○被災状況

法面崩壊 5箇所 L=18~92m
H=15~20m

○対応状況

通行規制 令和8年3月27日～交通開放
4t車以上通行止め
災害査定 令和7年12月 完了
調査設計 令和8年 6月 完了
用地取得 令和8年 7月 取得
復旧工事 令和8年 3月 完了（応急工事）
令和8年 8月 着工
令和9年 3月 完了（予定）

R7. 10. 14 大規模な崩土除去完了 R8. 3. 27 交通開放（4t車以上規制）



⑥天降川水系 角之下川（霧島市隼人町内山田内）

治水対策検討

○被災状況

浸水被害 浸水家屋 約90戸

○対応状況

応急工事 令和7年 9月 完了
寄洲除去、護岸補修等を実施
調査設計 令和7年12月 検討着手
天降川からの背水、角之下川の流下能力等の被災要因を整理し、ハード・ソフトの両面から様々な治水対策を検討。

地元説明 令和8年8月下旬 第1回説明会
浸水要因整理、対策の方向性を説明

隼人町内山田内での浸水状況



③県道 隼人溝辺線（霧島市隼人町嘉例川内）

災害復旧事業

○被災状況

道路流出 1箇所 L=35m, H=10m
法面崩壊 3箇所 L=35~50m, H=10~15m

○対応状況

通行規制 令和7年8月8日～通行止め
迂回路 国道223号, 国道504号
災害査定 令和7年12月 完了
調査設計 令和8年 7月 完了
用地取得 令和8年 9月 取得（予定）
復旧工事 令和8年10月 着工（予定）
令和9年 3月 完了（予定）

被災状況（道路流出）



被災状況（法面崩壊）



⑦崖崩れ 国分敷根地区（霧島市国分敷根内）

災害関連緊急治山事業・災害復旧事業

○被災状況

斜面崩壊 L=40m, H=200m, 施設被害 家屋1戸, 工場1棟, 道路埋塞100m

○対応状況

【治山事業】斜面復旧 A=7,900㎡, H=200m
事業採択 令和7年10月 6日 採択
調査設計 令和7年12月 完了
対策工事 令和8年 3月 着工
令和9年 3月 完了（予定）

【災害復旧】擁壁復旧 L=40m, H=7m

災害査定 令和7年10月27日 完了
調査設計 令和7年12月 完了
復旧工事 令和8年 1月 応急完了
令和8年 3月 着工
令和9年 3月 完了（予定）

斜面対策及び擁壁復旧の概要



④県道 豊後迫隼人線（霧島市隼人町松永内）

災害復旧事業

○被災状況

道路空洞 1箇所 L=47m, H=16m
法面崩壊 2箇所 L=25m, H=50~60m

○対応状況

通行規制 令和7年8月8日～通行止め
迂回路 県道都城隼人線, 国分霧島線
災害査定 令和7年12月 完了
調査設計 令和8年 1月 完了
復旧工事 令和8年 4月 着工
令和9年 3月 完了（予定）

※法面崩壊箇所：治山事業復旧後に復旧

被災状況（道路内部の空洞化）



被災状況（法面崩壊）



⑧土石流 田方川（霧島市福山町福山内）

災害関連緊急砂防事業

○被災状況

建物被害 一部損壊1戸, 福山港への土砂流出

○対応状況

事業採択 令和7年 9月5日 採択
事業概要 砂防堰堤1基 改築
地元説明 令和8年 8月上旬 開催
調査設計 令和8年 8月 完了
用地取得 令和8年11月 取得（目標）
対策工事 令和8年12月 着工（目標）

土石流対策の概要



令和7年8月豪雨災害 今後の災害復旧について

令和8年8月31日
始良・伊佐地域振興局建設部

【令和7年度】8月上旬の災害発生後、災害調査、道路啓開・応急復旧、災害査定を終え、調査設計や用地取得を伴わない箇所を中心に復旧工事を発注・契約。
【令和8年度】道路の流出や法面箇所、河川拡幅、砂防堰堤工事等については、調査設計後、地域の方々の御協力をいただきながら用地を取得し、早期に着工する予定。
【情報発信】令和7年12月下旬より、始良・伊佐地域振興局ホームページで「災害復旧だより」を公開中。発注済み箇所は、工事着工チラシを各地域に配布中。

※ 工事の完了時期は、各工事箇所の施工条件等により変わることがあります。

種別	復旧箇所の概要				対応状況		R8年度				R9年度			
					R8年8月末時点	R8年9月以降	6	9	12	3	6	9	12	3
災害復旧	道路	37箇所	道路流出・法面崩壊 (用地取得26箇所)	・道路復旧 ・法面復旧 等	交通開放 3箇所 通行止め 5箇所 用地取得 19箇所 工事着工 15箇所	用地取得 7箇所 工事着工 22箇所 交通開放 5箇所	用地取得	復旧工事						
							調査設計	用地取得	復旧工事					
	河川	302箇所	護岸損壊など	・護岸復旧 等	工事着工 269箇所	工事着工 33箇所 (うち災害関連33箇所)	復旧工事							
災害関連	急傾斜	国分敷根	霧島市 国分敷根地内	[急傾斜復旧] ・擁壁復旧 L=40m	測量設計 R7年12月 工事着工 R8年 3月	—	復旧工事							
				[治山災害関連] ・法面復旧 A=7,900㎡	事業採択 R7年10月6日 測量設計 R7年12月 完了 工事着工 R8年 3月	—	復旧工事							
	河川	網掛川	始良市 加治木町小山田地内	[改良復旧] 約5km ・河川拡幅 ・護岸復旧 33箇所 ・橋梁架替等	地元説明 R8年 2月 開催 事業採択 R8年 4月6日 中田橋下部工 R8年7月 着工 〃 工事用仮橋 R8年8月 完了	測量設計 R8年 9月 完了 用地説明会 R8年 9月 予定 用地取得 R8年10月 以降 工事着工 用地取得後、随時	護岸工事(災害復旧分)・中田橋下部工等							
							調査設計	用地取得	改良工事(河道拡幅など)					
	急傾斜	岩戸地区	始良市 蒲生町白男地内	・擁壁復旧 ・法面復旧	事業採択 R7年 9月5日 測量設計 R8年 3月 完了 地元説明 R8年 3月 開催 用地取得 R8年 6月 取得 工事着工 R8年 7月		用地取得	復旧工事						
	砂防	狩川右支沢	始良市平松地内	・砂防堰堤 新設1基	事業採択 R7年 9月5日 測量設計 R8年 3月 完了 地元説明 R8年 3月 開催	用地取得 R8年 9月 まで 工事着工 R8年10月 予定	用地取得	復旧工事						
							調査設計	用地取得	復旧工事					
	砂防	田方川	霧島市 福山町福山地内	・砂防堰堤 改築1基 ・管理用道路	事業採択 R7年 9月5日 測量設計 R8年 8月 完了 地元説明 R8年 8月 開催	用地取得 R8年11月 まで 工事着工 R8年12月 予定	調査設計	用地取得	復旧工事					

お問合せ先

【道路災害】 始良・伊佐地域振興局建設部土木建築課 TEL 0995-63-8365 FAX 0995-63-8345 (E-Mail) airaisa-doboku@pref.kagoshima.lg.jp
【河川・土砂災害】 〃 河川港湾課 TEL 0995-63-8367 FAX 0995-63-8345 (E-Mail) airaisa-kasen@pref.kagoshima.lg.jp

※始良・伊佐地域振興局のホームページで災害復旧だよりを公開しています <https://www.pref.kagoshima.jp/an14/r07saigaijoukyou/0708gatugousaigai.html>



HP URL

一般県道 十三谷重富線（霧始良市北山地内）災害復旧状況

令和8年8月31日
始良・伊佐地域振興局 建設部
土木建築課


令和7年12月20日以降 片側通行規制中



① 被災直後写真



② 応急工事後写真

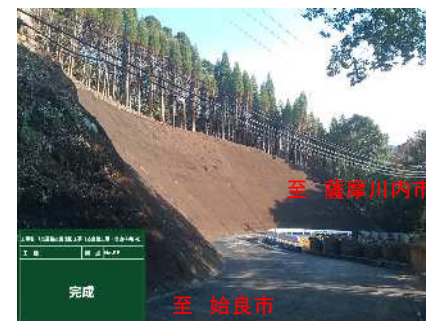


※工期は、工事金額に応じた標準的な期間を設定しており、工事着工後の現場状況に応じて変わることがあります。

手 順	対応状況	概要	工 程										備 考	
			R 8 年									R 9 年		
			4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1		2
①	用地取得		用地交渉											
②	本復旧工事	擁壁工			入札手続	7/16			工事					

国道 223号（霧島市隼人町嘉例川地内～牧園町宿窪田地内）災害復旧状況

令和8年8月31日
始良・伊佐地域振興局 建設部
土木建築課

令和7年10月17日以降 片側通行規制中

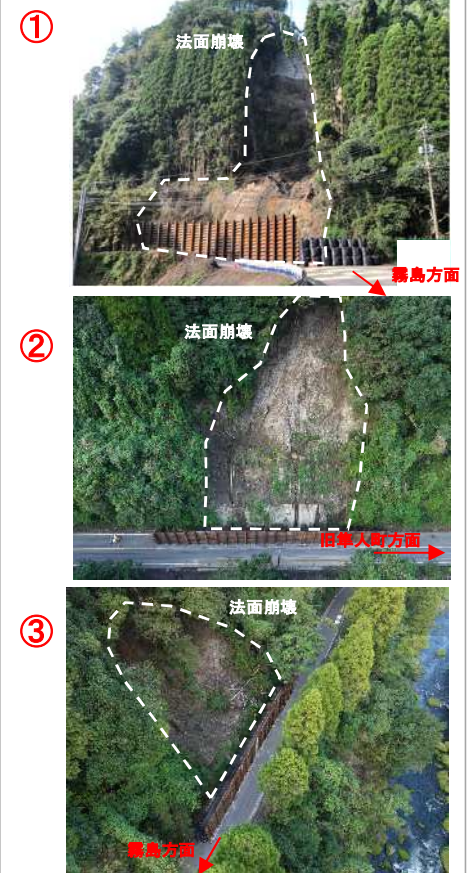


※工期は、工事金額に応じた標準的な期間を設定しており、工事着工後の現場状況に応じて変わることがあります。

番号	被災状況	工事概要	工 程												備 考
			R 8 年									R 9 年			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
①	法面崩壊 L=40m, H=90m	法面工	測量設計			入札手続	工事								
			用地交渉												
②	法面崩壊 L=36m, H=15m	法面工 落石防護柵	測量設計			入札手続	工事								
			用地交渉												
③	法面崩壊 L=27m, H=15m	法面工 落石防護柵	測量設計			入札手続	工事								
			用地交渉												

一般県道 犬飼霧島神宮停車場線（霧島市牧園町下中津川地内）災害復旧状況

令和8年8月31日
始良・伊佐地域振興局 建設部
土木建築課

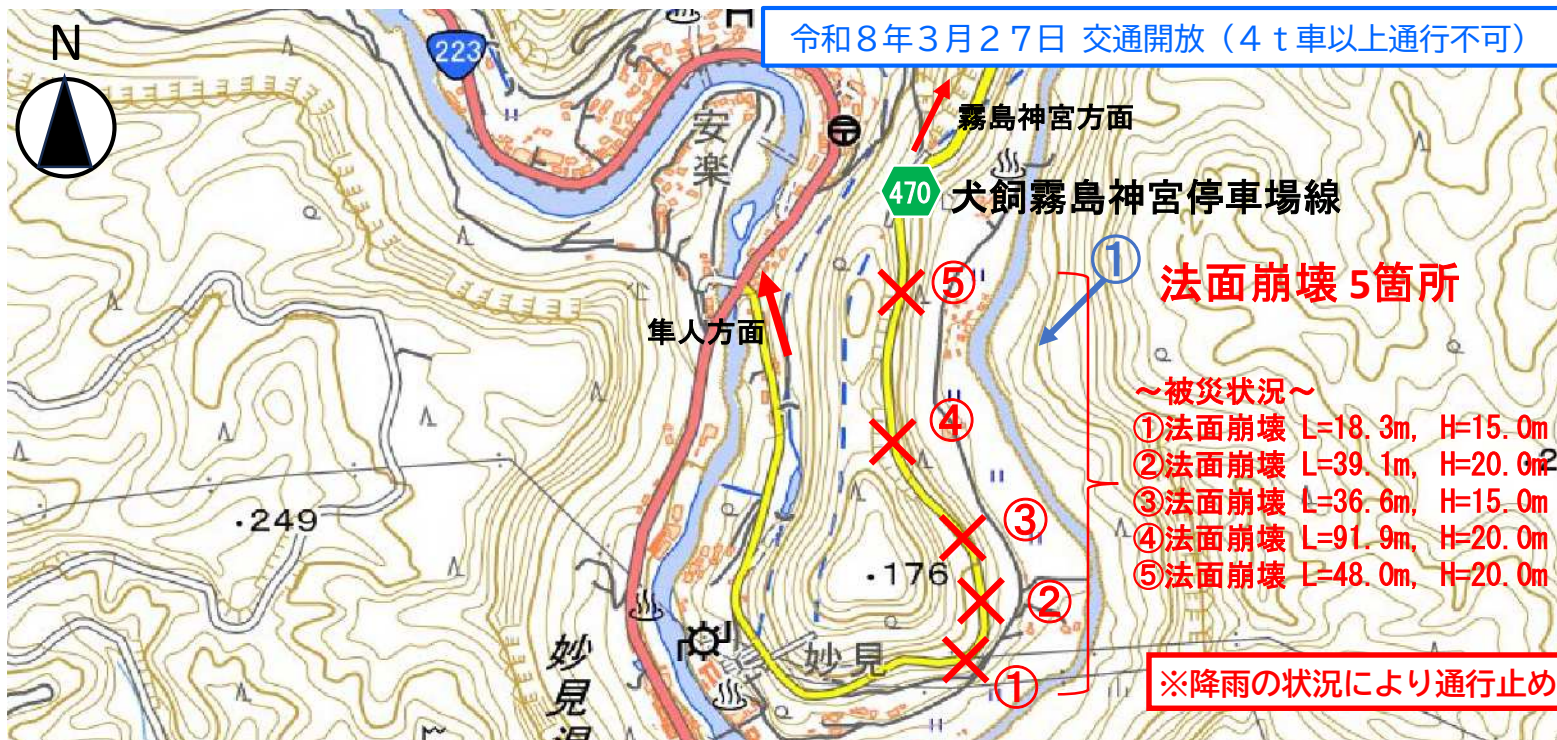

※工期は、工事金額に応じた標準的な期間を設定しており、工事着工後の現場状況に応じて変わることがあります。

手 順	対応状況	概要	工 程											備 考	
			R 8 年									R 9 年			
			4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1	2		3
1	測量設計	測量業務 一式 設計業務 一式 構造物設計 (法面・擁壁) 一式		測量設計											
2	用地取得				用地交渉										
3	本復旧工事	法面工，落石対策工，擁壁復旧 歩道復旧，重力式擁壁				入札手続	8/13		工事						

一般県道 隼人溝辺線（霧島市隼人町嘉例川地内）災害復旧状況

令和8年8月31日
始良・伊佐地域振興局 建設部
土木建築課




※工期は、工事金額に応じた標準的な期間を設定しており、工事着工後の現場状況に応じて変わることがあります。

番号	被災状況	工事概要	工 程												備 考
			R 8 年									R 9 年			
			4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1	2	3	
① ②	法面崩壊 路肩決壊 (W=1m) L=35m H=15m	法面工 擁壁工 舗装工	測量設計			用地交渉(権利関係手続きあり)						工事			道路 災害復旧
③	法面崩壊 路肩決壊 (W=1. 5m) L=50m, H=10m	法面工 擁壁工 舗装工	測量設計			用地交渉(権利関係手続きあり)						工事			道路 災害復旧
④	道路崩壊 L=35m	擁壁工 舗装工	測量設計			用地交渉(権利関係手続きあり)						工事			道路 災害復旧

一般県道 豊後迫隼人線（霧島市隼人町松永地内）災害復旧状況

令和8年8月31日
始良・伊佐地域振興局 建設部
土木建築課

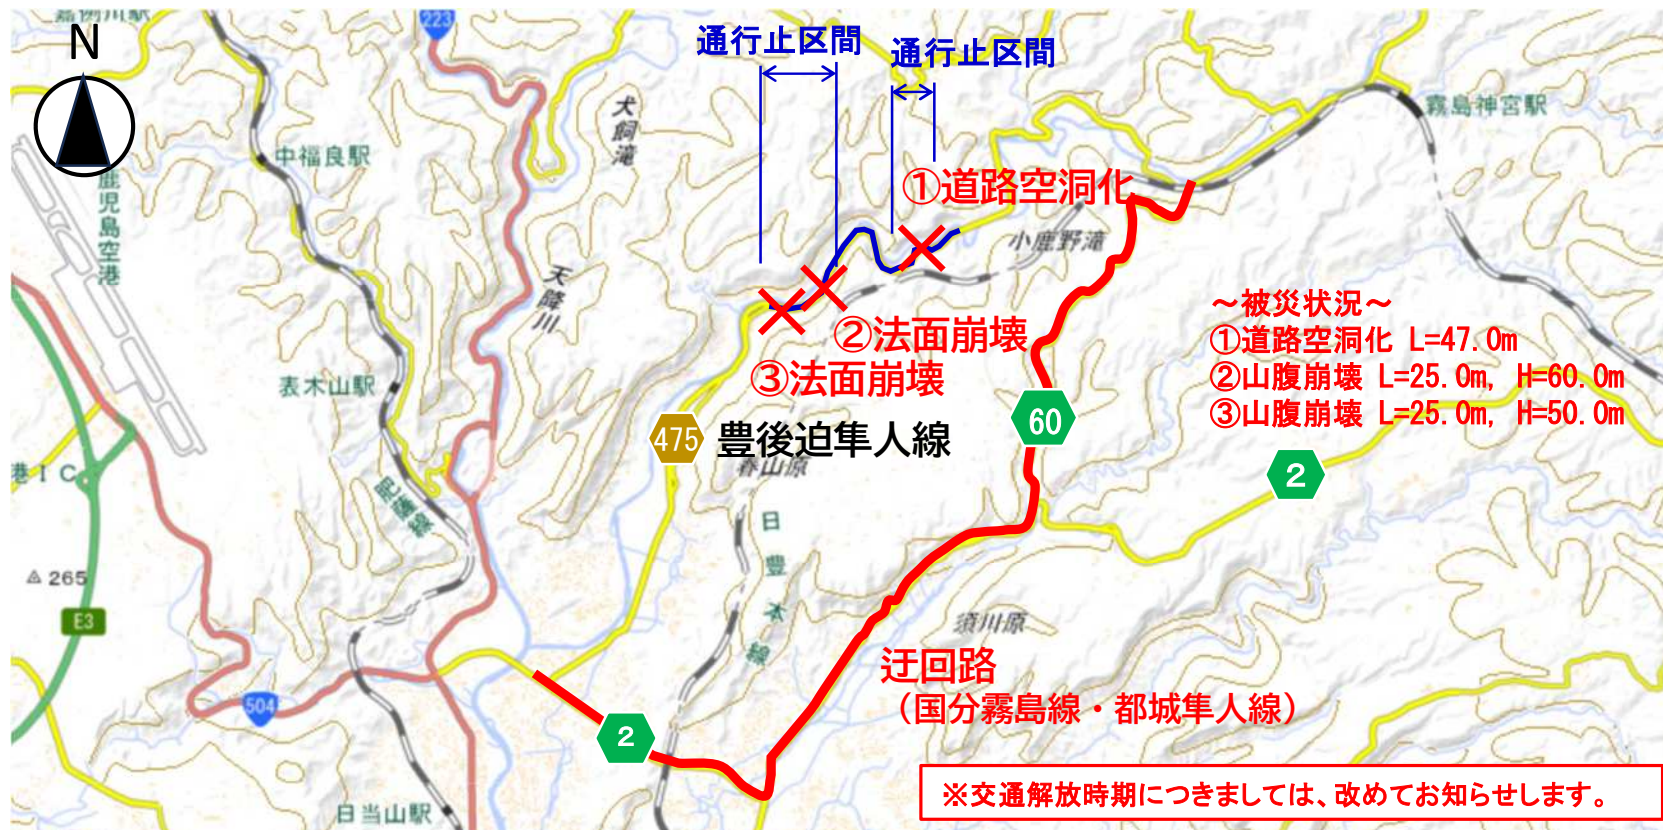


※工期は、工事金額に応じた標準的な期間を設定しており、工事着工後の現場状況に応じて変わることがあります。

番号	被災状況	工事概要	工 程												備 考
			R 8 年									R 9 年			
			4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1	2	3	
①	道路空洞化 L=47m	盛土工 排水工 舗装工	4/22 入札手続										3/12	道路 災害復旧	
②	山腹崩壊 L=25m、H=60m	山腹工 (転石固定等)	3/4 											治山 災害関連	
	道路防護柵 L=60m	落石防護柵等								未定 				道路 災害復旧	
③	山腹崩壊 L=25m、H=50m	山腹工 (転石固定等)	3/11 											治山 災害関連	

一般県道 大川原小村線（霧島市国分上之段～国分川内地内）災害復旧状況

令和8年8月31日
始良・伊佐地域振興局 建設部
土木建築課

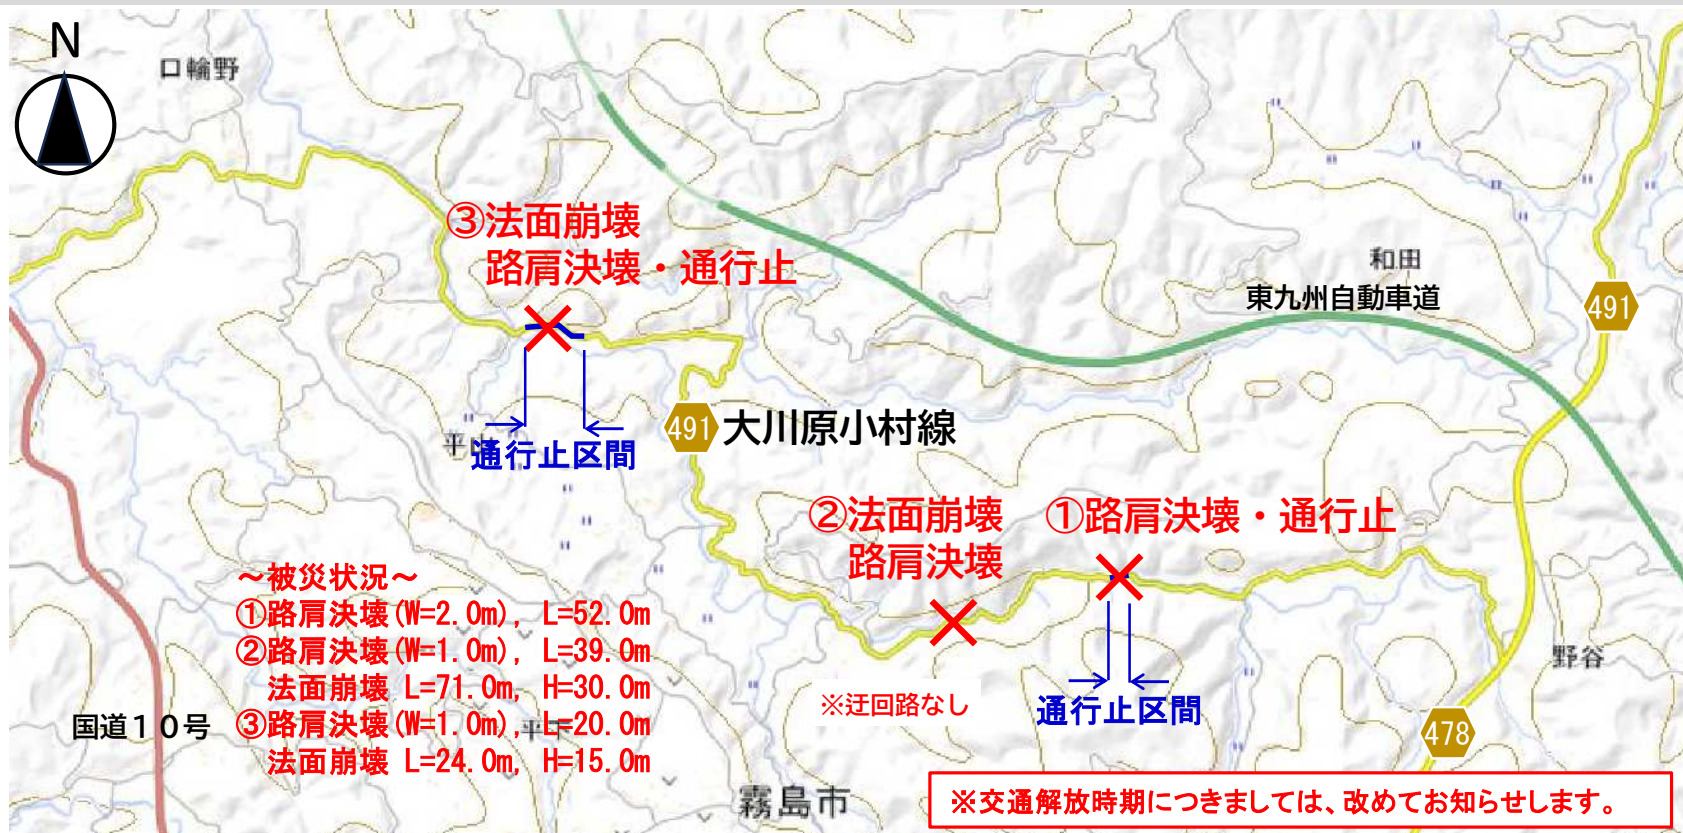

※工期は、工事金額に応じた標準的な期間を設定しており、工事着工後の現場状況に応じて変わることがあります。

番号	被災状況	工事概要	工 程												備 考	
			R 8 年									R 9 年				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	路肩決壊 (W=2.0m) L=52m	擁壁工 防護柵、舗装工	入札手続 4/24									12/14				
②	路肩決壊 (W=1.0m) L=39m	擁壁工 防護柵、舗装工						9月上旬				法面对策後に実施				
	法面崩壊 L=71m、H=30m	法面工 防護柵	設計書作成	入札手続 6/18					工事					2月中旬		
③	路肩決壊 (W=1.0m) L=20m	擁壁工 防護柵、法面工				用地交渉	入札手続 8/20		工事							
	法面崩壊 L=24m、H=15m	法面工 防護柵	測量設計													
